

Relatório de Desempenho do Projeto Livr-Ar: Sprint 1

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/04/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 1)	Patrick Domênico

1. Resumo Executivo da Sprint 1

- **Período da Sprint:** 05/03/2026 a 04/04/2026
- **Objetivo da Sprint:** Modelagem básica do sistema, abrangendo funcionalidades essenciais (cadastro de usuário, sistema de login e cadastro inicial de livros).
- **Status Geral:** Dentro do Prazo (com alteração de escopo).

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 0 dias. Como há apenas um desenvolvedor, as tarefas são iniciadas imediatamente após entrarem no Backlog da Sprint, sem tempo de espera na fila.
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** ~7 dias por módulo.
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 31 dias. (Ciclo completo da sprint).

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 3 tarefas macro entregues/Sprint (Cadastro de Usuário, Login, Cadastro de Livros Básico).

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 4
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 3
- **Justificativa de Desvios:** A tarefa de implementação de upload e inserção de imagens no cadastro dos livros apresentou complexidade técnica superior à antecipada. A decisão técnica foi remover essa funcionalidade do escopo inicial para não atrofiar o andamento do projeto e garantir a entrega da base do sistema.

3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** ~62 horas (média de 2h/dia).


4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

O fluxo ocorreu de maneira tranquila para a maioria das tarefas fundamentais. O único gargalo severo foi o gerenciamento de arquivos de imagem via formulário, que consumiu tempo excessivo de testes sem resultado satisfatório dentro do planejamento.

Abaixo foi criado um gráfico, mostrando os dias dedicados a cada tarefa.

Pontos marcados

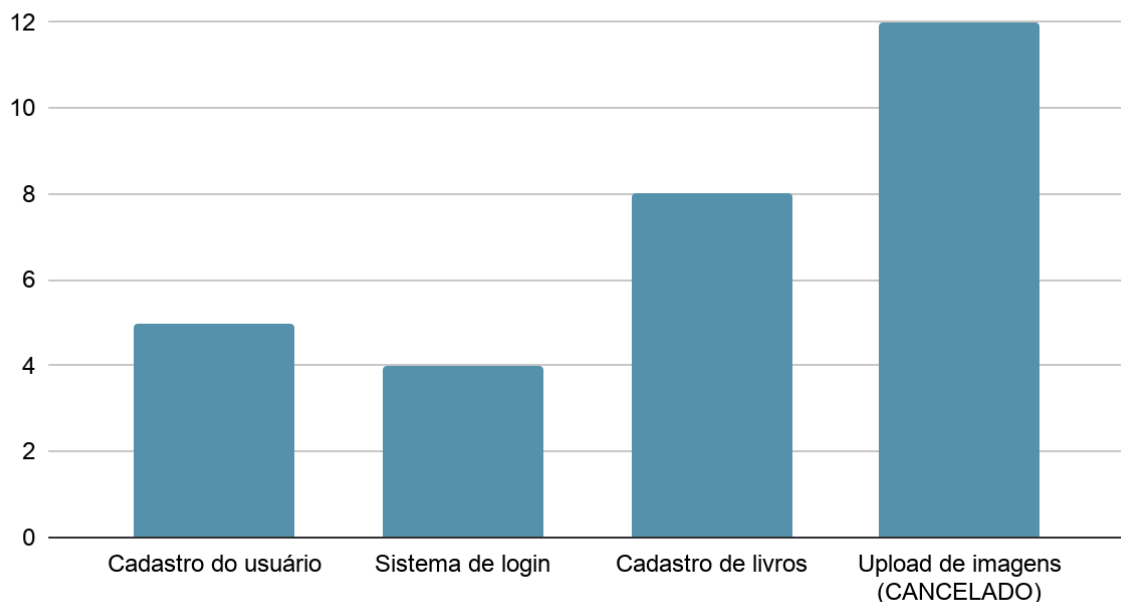

4.2. Estratégia de Mitigação

Para não comprometer a entrega da *Sprint*, optou-se pela estratégia de "descopo" (remoção da funcionalidade de imagens), priorizando as operações textuais no banco de dados.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Funcionalidades que envolvem manipulação de arquivos costumam trazer armadilhas no desenvolvimento web. É recomendável validar a viabilidade técnica (criar *Spikes* ou protótipos) antes de prometer features que fujam da lógica básica de CRUD de texto.

Relatório de Desempenho do Projeto Livr-Ar: Sprint 2

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
16/04/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 2)	Patrick Domênico

1. Resumo Executivo da Sprint 2

- **Período da Sprint:** 04/04/2026 a 16/04/2026
- **Objetivo da Sprint:** Integração do sistema de pesquisa no banco de dados, permitindo aos usuários buscar livros cadastrados e realizar filtros por estado de origem, categorias (revista, livro, gibi e didático) e gêneros.
- **Status Geral:** Dentro do Prazo.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 0 dias.
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** ~2,6 dias.
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 13 dias.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 5 tarefas entregues/Sprint.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 5
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 5
- **Justificativa de Desvios:** Não houve desvio na quantidade de entregas, mas o Cycle Time específico da tarefa de integração do Banco de Dados estourou a média planejada. Isso ocorreu devido à necessidade de nivelamento técnico em SQL (Joins) e troubleshooting da conexão entre PHP, HTML e o banco.

3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** ~26 horas


4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

O fluxo de desenvolvimento esteve engarrafado na comunicação entre Front-end, Back-end e Banco de Dados. O Cycle Time da tarefa de consulta SQL foi consideravelmente mais alto do que as tarefas de interface gráfica, devido à curva de aprendizado necessária para estruturar os comandos de Join de forma correta e fazê-los refletir no PHP/HTML. Como sou o único membro do projeto, todo o esforço de pesquisa, identificação do erro e correção recaiu sobre o tempo de desenvolvimento.

Abaixo foi criado um gráfico, mostrando os dias dedicados a cada tarefa.

Pontos marcados

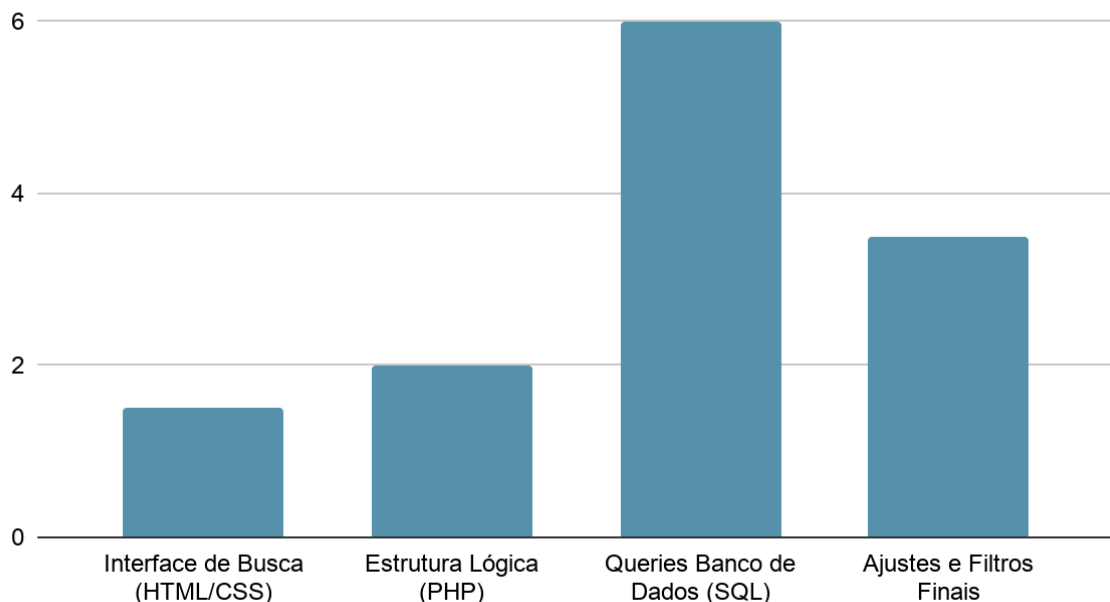

4.2. Estratégia de Mitigação

Estratégia de Mitigação Para as próximas sprints, foi adotado a prática de criar tarefas de "Spike", tarefas de pesquisa e estudo prévio, durante o planejamento. Ao isolar o aprendizado em uma tarefa dedicada antes da execução, é evitado que o tempo de codificação em si pareça excessivo ou travado, separando claramente o momento de "aprender" do momento de "produzir".

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Trabalhar como membro único requer uma estimativa mais generosa para resolução de bugs. Dividir os casos de uso complexos (como a pesquisa filtrada) em tarefas ainda menores no nível do banco de dados me ajudará a isolar os erros com mais rapidez no futuro.

Relatório de Desempenho do Projeto Livr-Ar: Sprint 3

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
21/05/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 3)	Patrick Domênico

1. Resumo Executivo da Sprint 3

- **Período da Sprint:** 17/05/2026 a 21/05/2026
- **Objetivo da Sprint:** Refatoração da arquitetura (separação de CSS e PHP do HTML), criação de scripts dinâmicos de interface em JavaScript e implementação do sistema de comunicação (chat interno, marcação de indisponibilidade e alertas automáticos de interesse).
- **Status Geral:** Dentro do Prazo.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 0 dias.
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** ~1,2 dias.
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 5 dias.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 4 tarefas entregues/Sprint.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 4
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 4
- **Justificativa de Desvios:** Não houve desvios de escopo, apenas alta concentração de esforço na tarefa do Chat.

3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** ~10 horas.


4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

O maior desafio e o gargalo da *sprint* foi a criação da página de chat interno. O requisito de enviar e receber mensagens com atualização em tempo real, sem a necessidade de recarregar a página, exigiu uma imersão forçada em funcionalidades assíncronas de JavaScript.

Abaixo foi criado um gráfico, mostrando os dias dedicados a cada tarefa.

Pontos marcados

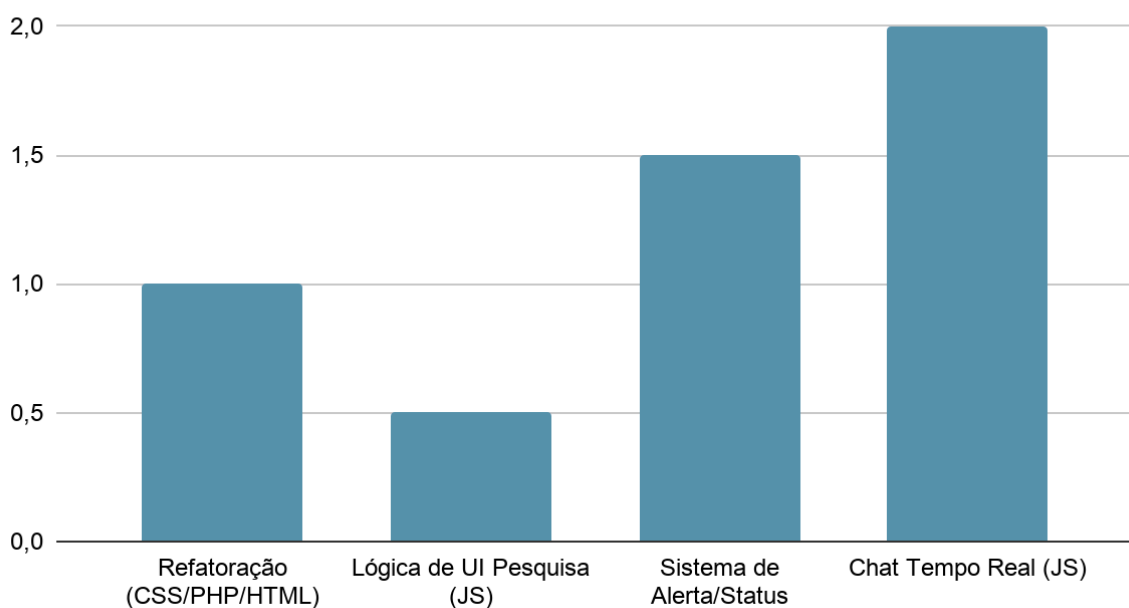

4.2. Estratégia de Mitigação

Investimento intenso em pesquisa de soluções em JavaScript (como uso de fetch/AJAX e funções de intervalo) para resolver a comunicação cliente-servidor sem bloqueios.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Sistemas em tempo real introduzem uma camada de complexidade técnica alta. O domínio do JavaScript se mostrou tão crítico quanto o PHP/SQL para a experiência do usuário final.

Relatório de Desempenho do Projeto Livr-Ar: Sprint 4

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/06/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 4)	Patrick Domênico

1. Resumo Executivo da Sprint 4

- **Período da Sprint:** 25/05/2026 a 10/06/2026
- **Objetivo da Sprint:** Desenvolvimento do painel de gerenciamento de livros do usuário (visualizar, excluir, disponibilizar e arquivar) e implementação do framework Bootstrap para estilização e responsividade de todas as páginas.
- **Status Geral:** Dentro do Prazo.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 0 dias
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** ~3 dias
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 17 dias

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 2 grandes blocos entregues/Sprint (Painel de Acervo Pessoal e Refatoração Visual Global).

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 2
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 2
- **Justificativa de Desvios:** Sem desvios. Todo o escopo foi cumprido, mas a carga operacional da implementação visual foi muito densa.

3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** ~34 horas.


4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

O gerenciamento lógico do acervo do usuário fluiu bem. O grande gargalo ocorreu na implementação do Bootstrap. Apesar da ferramenta em si não ser difícil de compreender, sua aplicação em um sistema já existente exigiu um trabalho extremamente braçal e repetitivo, pois foi necessário alterar, adaptar classes (*buttons*, *headers*, *footers*) e testar a estilização de cada página individualmente para garantir um layout dinâmico e responsivo.

Abaixo foi criado um gráfico, mostrando os dias dedicados a cada tarefa.

Pontos marcados

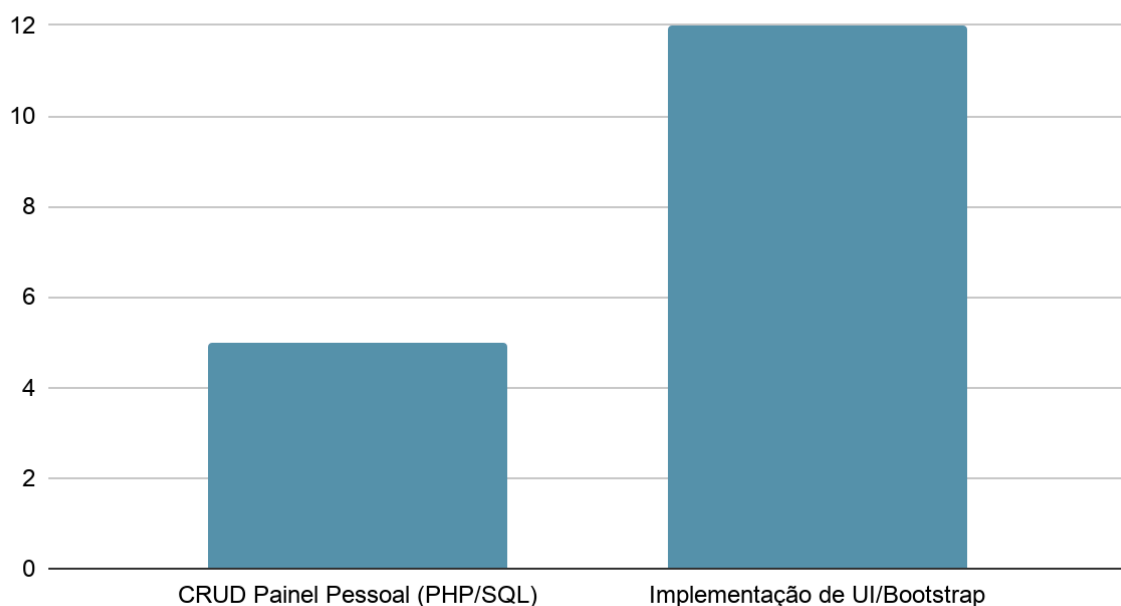

4.2. Estratégia de Mitigação

O trabalho manual foi resolvido com foco e repetição técnica. A criação de arquivos separados para *headers* e *footers* ajudou a reduzir parte da redundância do processo nas etapas finais.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Adoção de frameworks de interface (como Bootstrap) e padronização visual devem, idealmente, ocorrer no início do projeto (fase inicial de layout). Deixar a estilização global para uma das últimas *sprints* gerou um enorme retrabalho em arquivos que já estavam prontos e testados.
